



Werk in uitvoering

April 2018

Extra werkzaamheden door vervanging hoog- en laagspanningskabels Stedin

Vervangen elektriciteitskabels

Zoals u wellicht gezien hebt, verloopt het grootste deel van de werkzaamheden voorspoedig in fase 1 en 2 van de Schepenstaat. In de week van 26 maart zijn de bomen geplant in het eerste deel van de straat. Aansluitend wordt een groot deel van de bestrating aangebracht. In de week van 2 april zullen ook de planten en heesters geplant worden. Dit deel van het werk loopt ongeveer twee weken vóór op schema.



aanvoer bomen. Foto: W. Hoffmann

Echter, Stedin heeft alsnog besloten dat de hoogspanningskabels in de Schepenstraat tóch vervangen zullen worden. Dit zijn de leidingen waarin vorig jaar een storing ontstond. Stedin komt bij nadere bestudering van de schade tot deze conclusie, waardoor de planning enigszins

op de schop moet. Dit werk start 9 april. Het zorgt er voor dat het trottoir aan de noordzijde (oneven zijde) de komende 9 weken nog open moet blijven liggen.

Waarom vervangen van hoog- en laagspanningskabels?

De vier hoogspanningskabels zijn vorig jaar gerepareerd na een grote stroomstoring. Bij de planning van de herinrichting van de Schepenstraat heeft de gemeente alle nutsbedrijven tijdig geïnformeerd en gevraagd naar hun plannen voor aanpassingen en vervanging. Stedin had in eerste instantie aangegeven geen werkzaamheden te hebben, maar tijdens de uitvoering bleek dat hun kabels zozeer verzakt zijn dat het efficiënter is om nu de kabels te vernieuwen. Hun besluitvormingsproces liep helaas achter op de rest van de werkzaamheden in de Schepenstraat.

Inhoud werkzaamheden

Het betreft het vervangen van vier hoogspannings- en een laagspanningskabel die aan de noordzijde (de oneven kant) van de Schepenstraat liggen. De te vervangen hoogspanningskabels (355 m') liggen vanaf de Schieweg tot voorbij de Prinsekerk op 1,5 m. diepte. Daarom is een behoorlijk lange en brede


sleuf nodig, die ook nog eens lang open blijft liggen omdat de kabels stuk voor stuk gelegd worden, waarna de oude kabels ook stuk voor stuk verwijderd moeten worden. Tijdens het graven van de sleuf is zorgvuldigheid geboden: de bestaande kabels en buizen moeten op hun plaats blijven liggen. Daarvoor zijn tijdelijke hulpconstructies en stutten nodig. Weliswaar worden de hoogspanningskabels met zand afgedekt nadat ze gelegd zijn, maar daarna wordt de laagspanningskabel ook vervangen en worden alle woningen opnieuw aangesloten. Daarom blijft de sleuf tot die tijd open.



Hier komt de sleuf voor de hoogspanningskabels

Planning en toegankelijkheid

Het werk aan de hoog- en laagspanningskabels plus de huisaansluitingen zal in totaal ongeveer negen weken in beslag nemen. Onder de kruisingen met de Nolensstraat, de Statensingel (ook de Statensingel naast de kerk) en de Jan van Troyenstraat worden buizen gelegd om de kabels doorheen te trekken, zodat de sleuf daar niet lang open hoeft te liggen. Per kruising duurt dat werk een dag en dat gebeurt in de eerste week van de werkzaamheden, vanaf 10 april. Bij de portieken komen tijdelijke bruggetjes over de sleuf, zodat de woningen altijd toegankelijk blijven. Daarna worden de vier hoogspanningskabels gelegd.

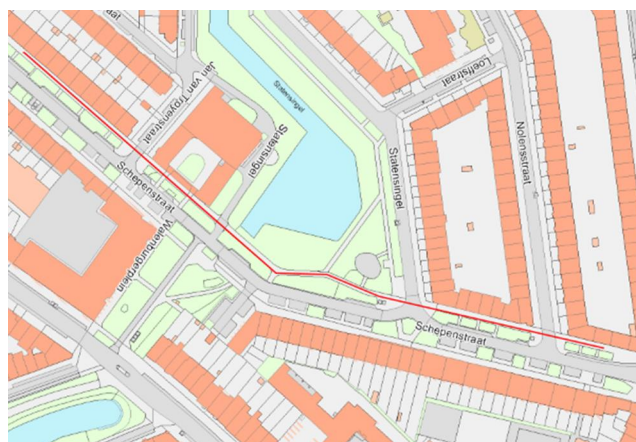

plaats van de nieuwe kabels

Langer werken in lastenten

Op de plaatsen waar de nieuwe aan de oude kabels verbonden worden is men gedurende drie weken aan het werk. Dit gebeurt in twee zogenoemde lastenten, één ongeveer ter hoogte van nr. 7 en één voorbij de Jan van Troyenstraat, ongeveer ter hoogte van nr. 77. Omdat het maken van een las 10 tot 12 uur duurt, zal in deze tenten langer dan gebruikelijk gewerkt worden. Dit gaat echter niet gepaard met geluidsoverlast. Daarna worden de oude hoogspanningskabels één voor één verwijderd. De sleuf loopt van nr 5 tot nr 87 omdat de oude kabels ook (net zoals de nieuwe kabels) op de juiste hoogte gelegd moeten worden.

Laagspanningskabel en huisaansluitingen

De laagspanningskabel wordt alleen vervangen tussen de Schiekade en de Statensingel. De werkzaamheden hiervoor zijn eenvoudiger: het werk vindt medio mei plaats en het duurt ongeveer een week. Aansluitend worden de woningen stuk voor stuk hierop aangesloten. Daarvoor worden per adres afspraken gemaakt door de aannemer van Stedin.

Werk aan het riool

Fase 3 en verder wordt gepland op basis van een wekenplanning die regelmatig aangepast wordt. De resultaten daarvan staan op de site van het Kernteam: www.schepensstraat.info.
